



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL DOMINGOS SOARES



Local da Obra - Descrição	Contratação de empresa para execução de serviços para empreitada global de material e mão de obra para <u>Reforma no Ginásio de Esportes João Maria Alves Taques</u> , junto ao Município de Coronel Domingos Soares. <u>CONTRATO 146/2022</u>
Data de Início e Término	Execução 4 meses (03/10/2022 à 02/02/2023) contados partir do 10º (décimo) dia publicação da ordem de serviços. Publicação da ORDEM DE SERVIÇO (30/11/2022)
Fases da obra	1ª Medição – R\$ 49.094,30 2ª Medição – R\$ 90.536,03 3ª Medição – R\$ 117.112,26 4ª Medição – R\$ 29.645,68 <u>OBRA FINALIZADA</u>
Custo Total	R\$ 239.335,19 + Aditivos = R\$ 286.388,27
Composição de Custo	Recursos Próprio
Executor – EMPRESA	<u>GERAÇÃO SOLAR - GERSON VENITES</u>
Responsáveis Técnicos	DANIEL MASQUI RIBEIRO (Empresa) KEURY FABRIS MARCON (Prefeitura)

Fotografias







PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL DOMINGOS SOARES

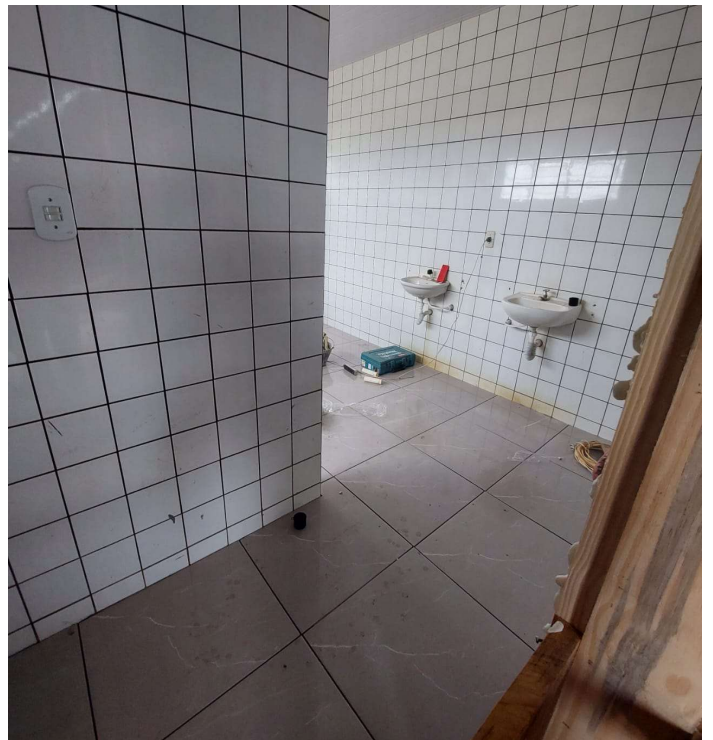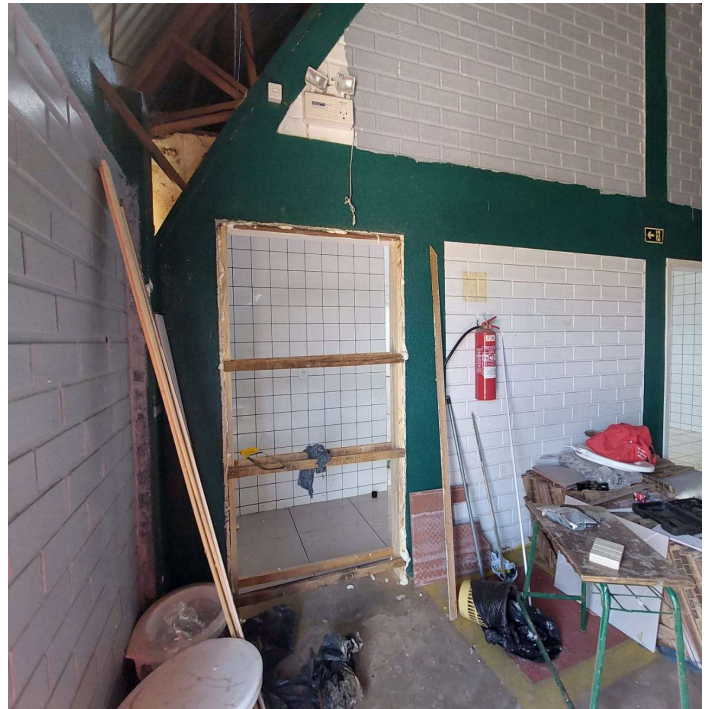




PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL DOMINGOS SOARES

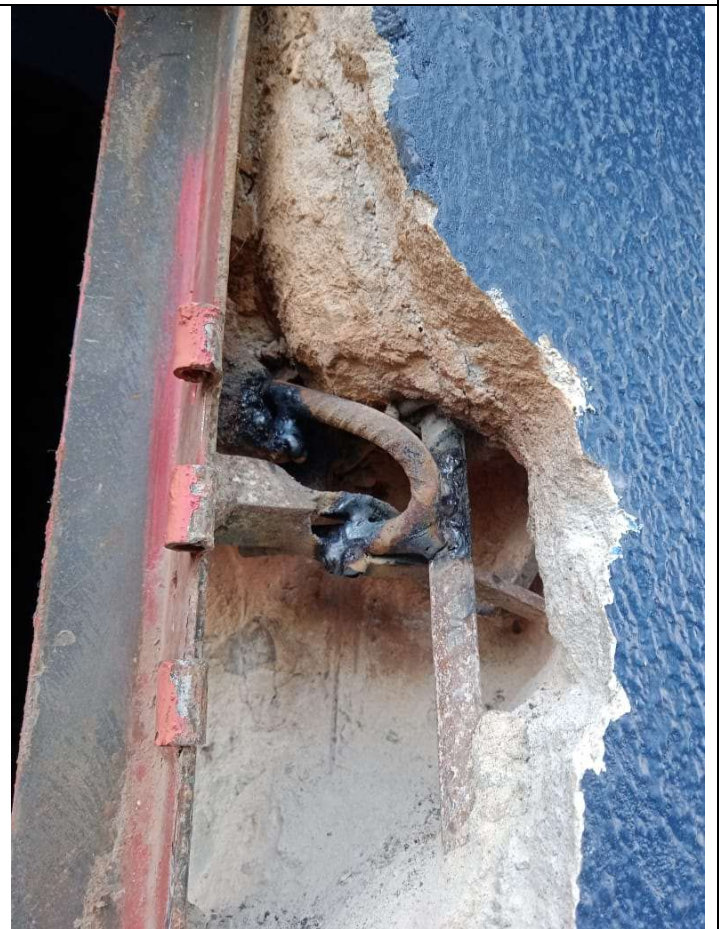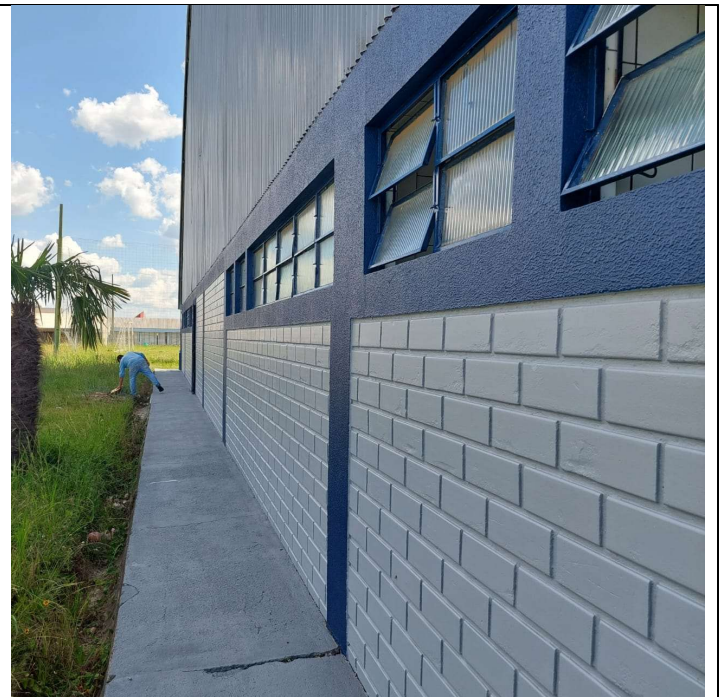




PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL DOMINGOS SOARES

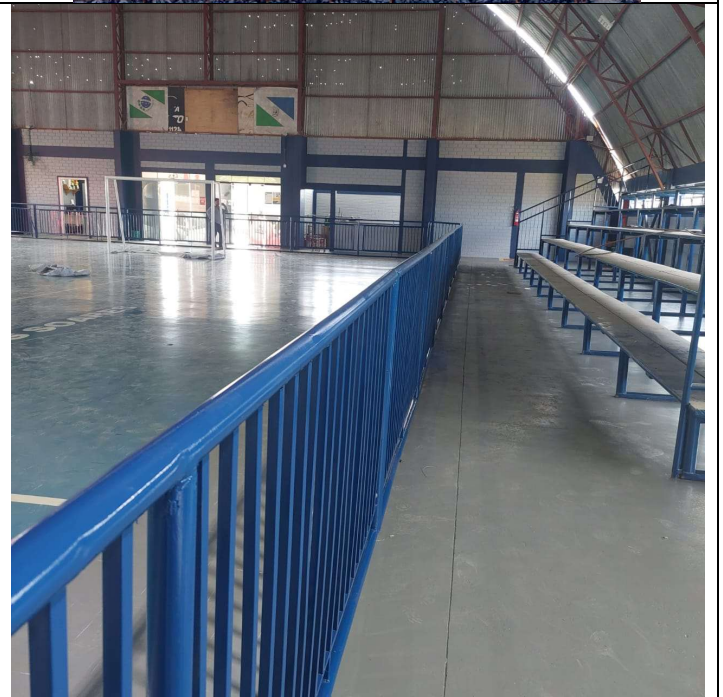



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL DOMINGOS SOARES

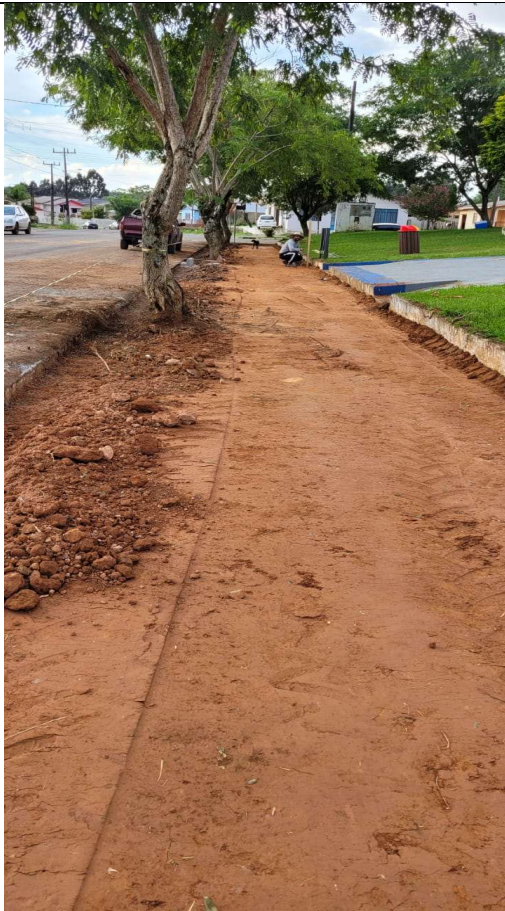



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL DOMINGOS SOARES

